Harsdorfsvej 10A og 10B d.31.7.2008/MP

Id	Opgave	Startdato	Slutdato
1	Etablering af byggeplads	ma 23-06-08	ma 30-06-08
2	**Baggård**	**ma 23-06-08**	**ma 15-12-08**
3	Baggård oprydning, etablering af nyt dræn, kloak,grus m.v	ma 23-06-08	to 24-07-08
4	Stilladsopsætning	to 24-07-08	fr 01-08-08
5	Facade hedvandsafrensning m.v	ma 04-08-08	on 06-08-08
6	Facade murereparationer, brandkamme,skorsten m.v	ma 04-08-08	ma 11-08-08
7	Vinduesudskiftning gård	ma 11-08-08	fr 05-09-08
8	Etablering af gavlisolering	ma 04-08-08	fr 15-08-08
9	Malerbehamdling gård facade inkl malebehandling af vindueslysninger	ma 18-08-08	on 17-09-08
10	Nedtagning af stillads	to 18-09-08	fr 19-09-08
11	Støbning af punktfundamenter,nedrivning af brystninger,etablering af altandøre og altaner	ma 22-09-08	ti 07-10-08
12	Ny belægning i gård (afslutning)	on 08-10-08	fr 07-11-08
13	Blikkenslager arbejde gård	ma 04-08-08	fr 22-08-08
14	**Gadefacaden**	**ma 04-08-08**	**ma 15-12-08**
15	Hedvandsrensning underfacaden og rep af Kvaderpuds	ma 11-08-08	fr 15-08-08
16	Opsætning stillads m.v	ti 05-08-08	fr 08-08-08
17	Facaden hedvandsrenses m.v	ma 11-08-08	on 13-08-08
18	Murereparationer(fuger, puds, revner, gesims,brandkamm m.v)	on 13-08-08	on 10-09-08
19	Etablering af tørledninger for nye nedløb, i forgård	on 24-09-08	ti 30-09-08
20	Demontering af radiatorer (bygherre)	ma 04-08-08	on 06-08-08
21	Vindueudskiftning	ma 08-09-08	fr 19-09-08
22	Maling af facaden m.v	ma 01-09-08	ma 27-10-08
23	Nedtagning af stillads	ma 29-09-08	ti 30-09-08
24	Opsætning af platform,nedrivning af brystninger,etablering af altandøre og altaner m.v	ma 06-10-08	ma 15-12-08
25	Blikkenslager arbejde gade	on 10-09-08	ti 16-09-08
26	**Aflevering m.v**	**ma 01-12-08**	**fr 19-12-08**
27	Diverse opfølgning og afjælpning	ma 01-12-08	to 18-12-08
28	Afrigning af byggeplads	to 18-12-08	to 18-12-08
29	Afleveringsforretning	fr 19-12-08	fr 19-12-08

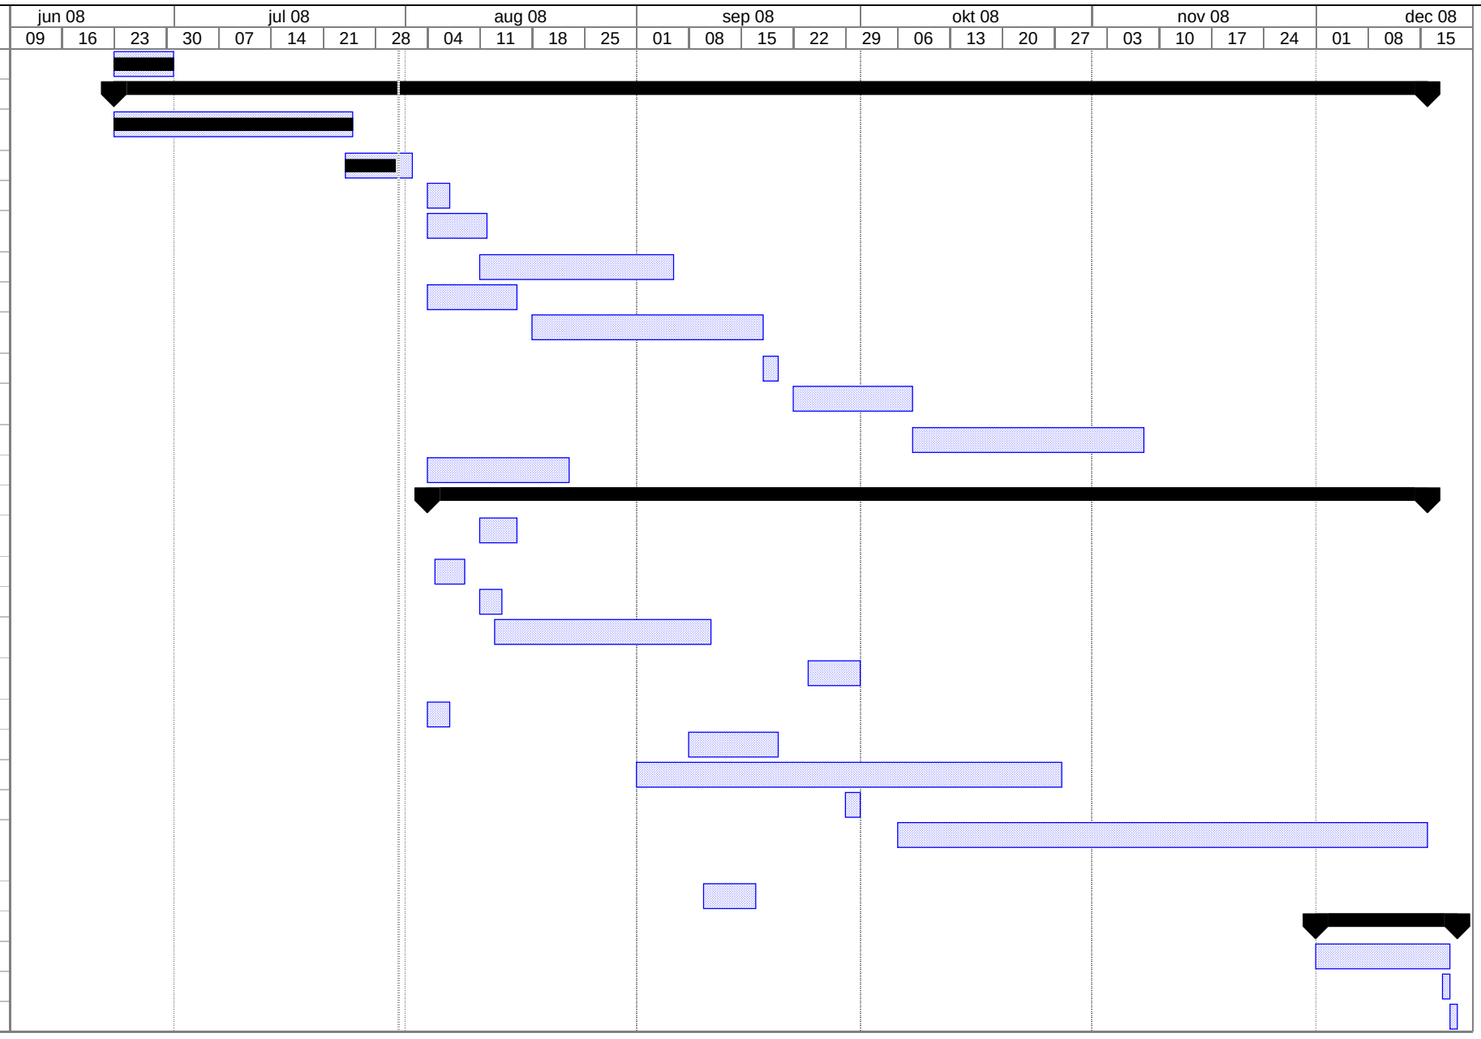

Projekt: Harsdorfsvej 10A og 10B dat
Dato: to 31-07-08

Opgave · Opdeling · Fremdrift · Milepæl · Oversigt · Projektoversigt · Eksterne opgaver · Ekstern milepæl · Deadline
