Harsdorfsvej 10A og 10B d.28.8.2008/MP

Id	Opgave	Startdato	Slutdato
1	Etablering af byggeplads	ma 23-06-08	ma 30-06-08
2	**Baggård**	**ma 23-06-08**	**to 15-01-09**
3	Baggård oprydning, etablering af nyt dræn, kloak,grus m.v	ma 23-06-08	to 24-07-08
4	Stilladsopsætning	to 24-07-08	fr 01-08-08
5	Facade hedvandsafrensning m.v	ma 04-08-08	on 27-08-08
6	Facade murereparationer, brandkamme,skorsten m.v	ma 04-08-08	fr 22-08-08
7	reparation af vinduer udført 18 stk.	fr 08-08-08	fr 05-09-08
8	Esktra arbejder på bagfacade	fr 18-07-08	ma 08-09-08
9	Vinduesudskiftning gård	ma 08-09-08	fr 03-10-08
10	Fugning af vinduer	to 18-09-08	to 02-10-08
11	Etablering af gavlisolering	ma 04-08-08	fr 05-09-08
12	Malerbehamdling gård facade inkl malebehandling af vindueslysninger	fr 03-10-08	to 16-10-08
13	Nedtagning af stillads	on 15-10-08	ma 20-10-08
14	Støbning af punktfundamenter,nedrivning af brystninger,etablering af altandøre og altaner	ma 20-10-08	ti 04-11-08
15	Ny belægning i gård (afslutning)	ma 03-11-08	on 03-12-08
16	Blikkenslager arbejde gård	ma 29-09-08	fr 17-10-08
17	**Gadefacaden**	**ma 04-08-08**	**to 15-01-09**
18	Hedvandsrensning underfacaden og rep af Kvaderpuds	ma 11-08-08	fr 26-09-08
19	ekstra arbejder murer	ma 15-09-08	fr 26-09-08
20	Opsætning stillads m.v	ti 05-08-08	fr 08-08-08
21	Facaden hedvandsrenses m.v	ma 04-08-08	fr 22-08-08
22	Murereparationer(fuger, puds, revner, gesims,brandkamm m.v)	on 13-08-08	fr 19-09-08
23	Etablering af tørledninger for nye nedløb, i forgård	fr 31-10-08	to 06-11-08
24	Vindueudskiftning	ma 22-09-08	fr 03-10-08
25	Fugning af vinduer	ma 06-10-08	ma 13-10-08
26	Maling af facaden m.v	ti 14-10-08	ti 28-10-08
27	Nedtagning af stillads	on 29-10-08	to 30-10-08
28	Opsætning af platform,nedrivning af brystninger,etablering af altandøre og altaner m.v	to 06-11-08	to 15-01-09
29	Blikkenslager arbejde gade	on 10-09-08	ti 16-09-08
30	**Aflevering m.v**	**ma 01-12-08**	**fr 19-12-08**
31	Diverse opfølgning og afjælpning	ma 01-12-08	to 18-12-08
32	Afrigning af byggeplads	to 18-12-08	to 18-12-08
33	Afleveringsforretning	fr 19-12-08	fr 19-12-08

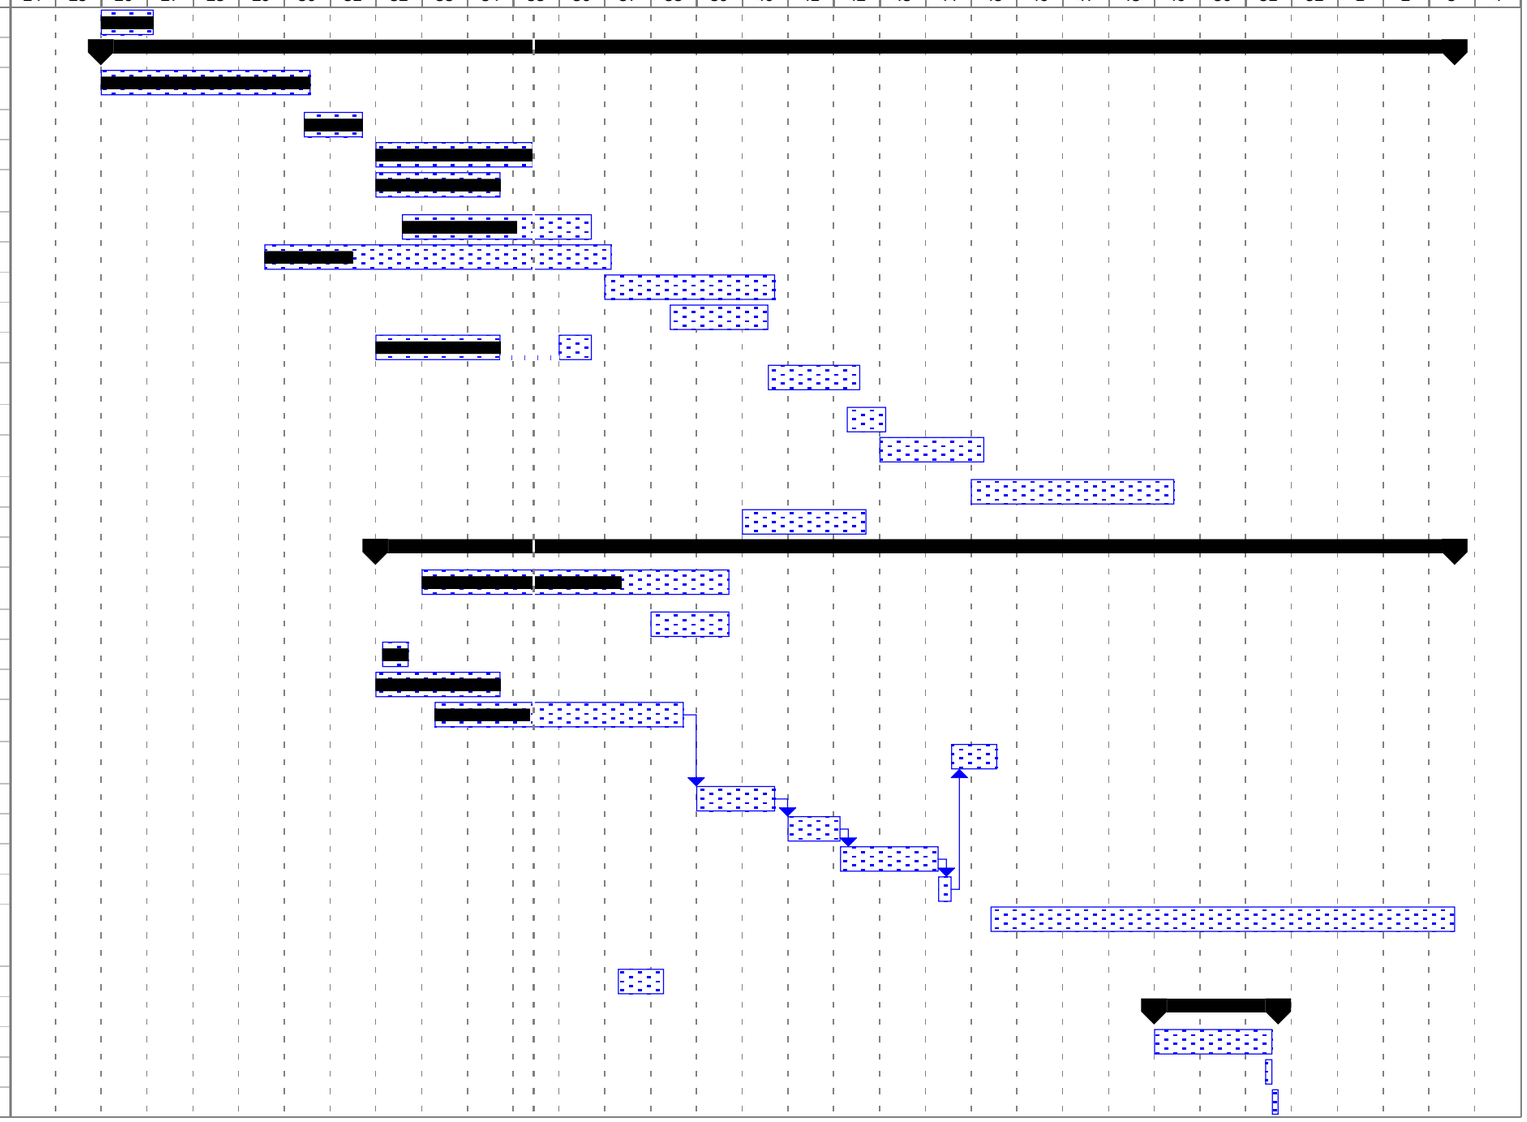

Projekt: Harsdorfsvej 10A og 10B dato
Dato: to 28-08-08

Opgave | Fremdrift | Oversigt | Eksterne opgaver | Deadline
Opdeling | Milepæl | Projektoversigt | Ekstern milepæl

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
